

* STATUS REPORT · DISTRIBUIDORA EXEMPLO · IMPLANTAÇÃO DO CRM · 30/09/2026

Onde o projeto está hoje

O que já foi entregue, o que segue em aberto e onde estão os atrasos.

Números calculados a partir de planilha do projeto (exemplo fictício), sem digitação à mão

CONFIDENCIAL · USO DO CLIENTE

29% concluído: 9 de 31 atividades, e 15 estão atrasadas.

ATIVIDADES

31

todas as da lista

CONCLUÍDAS

29%

9 de 31

EM ANDAMENTO

7


1 bloqueada à parte

ATRASADAS


15

prazo vencido, de 22 que faltam


Chegou mais do que saiu: 22 atividades entraram e 9 foram concluídas em 8 semanas, e o que falta subiu de 9 para 22.

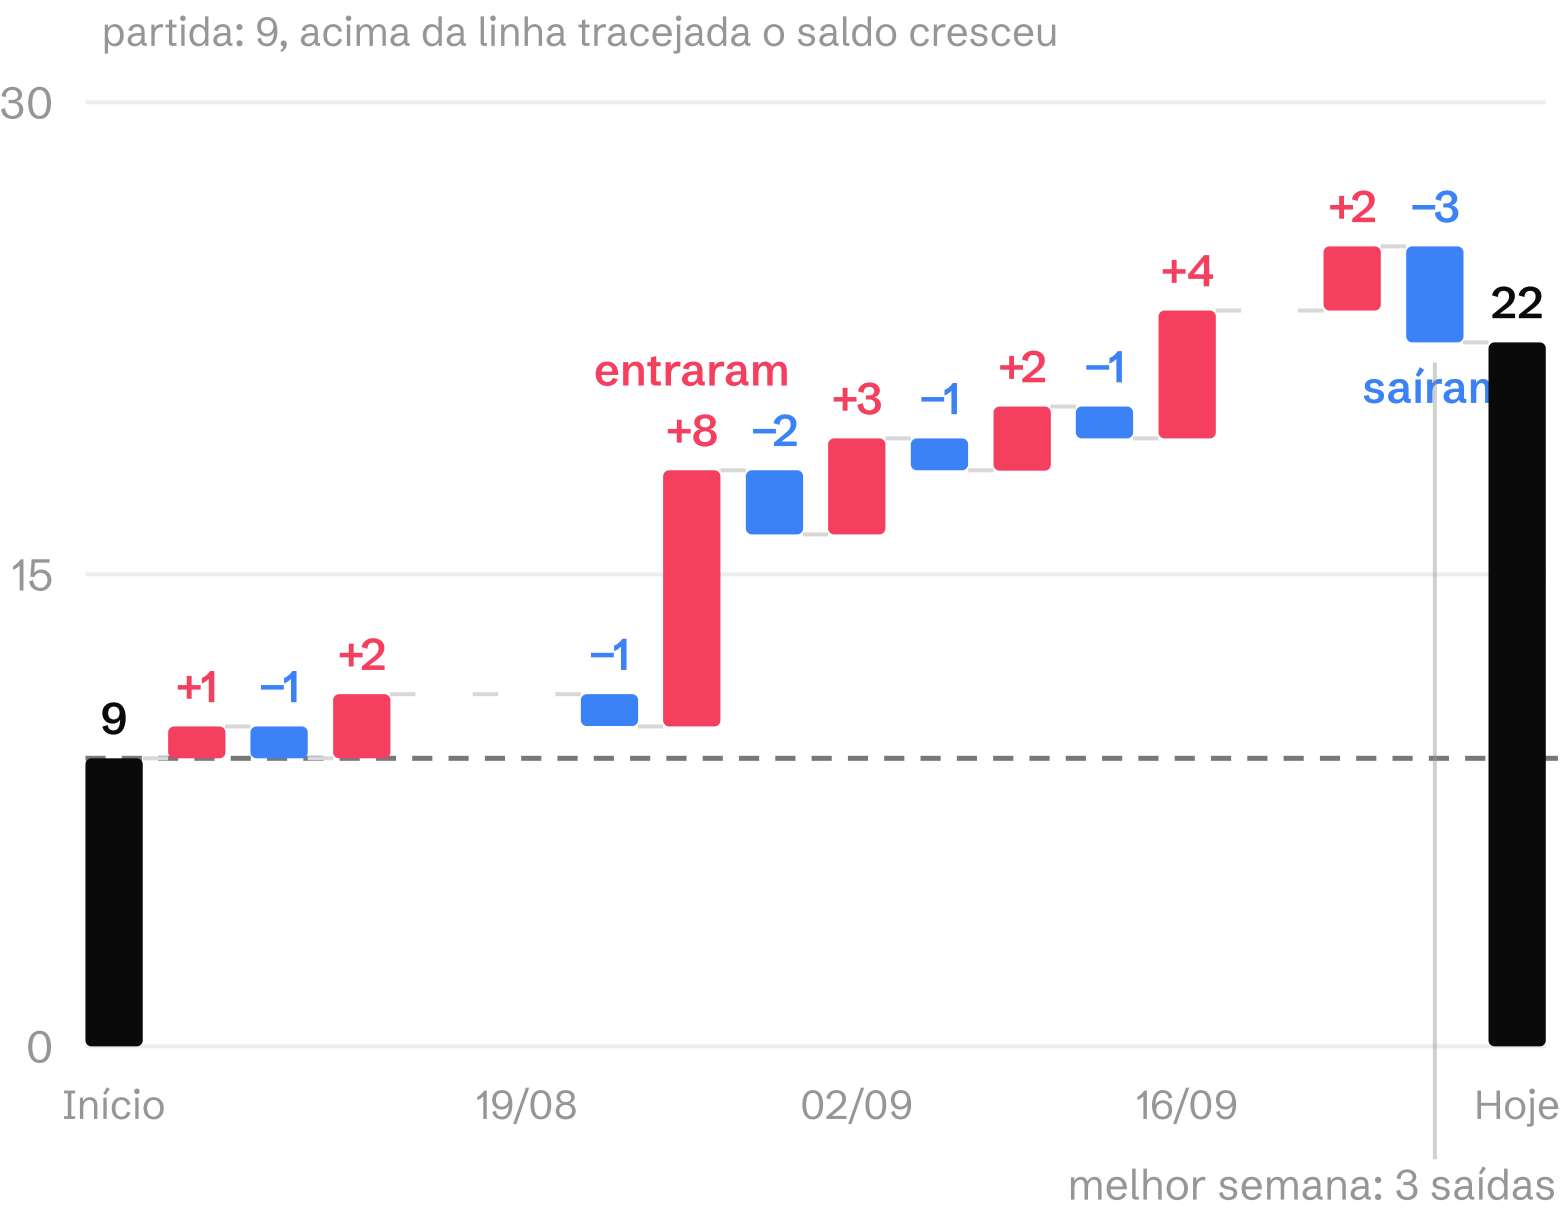

Nenhuma frente concluída ainda. A mais adiantada é Cadastro de clientes, com 4 de 7.

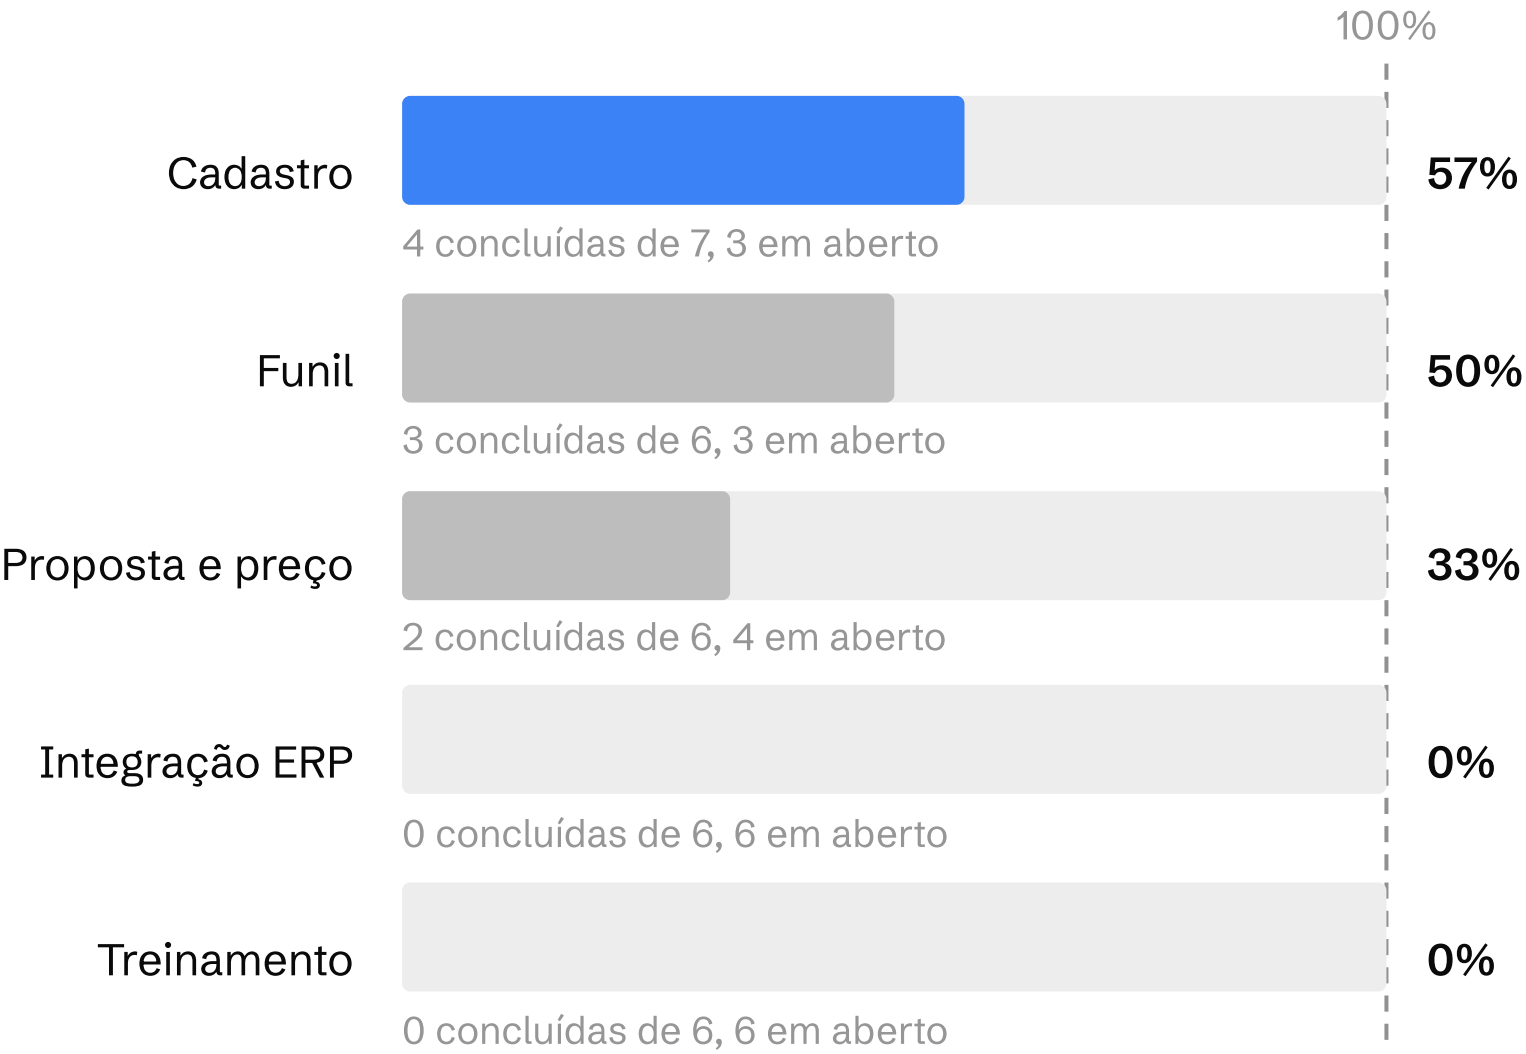


A entrega acelerou: 5 atividades nas últimas 4 semanas, contra 4 nas 4 anteriores.

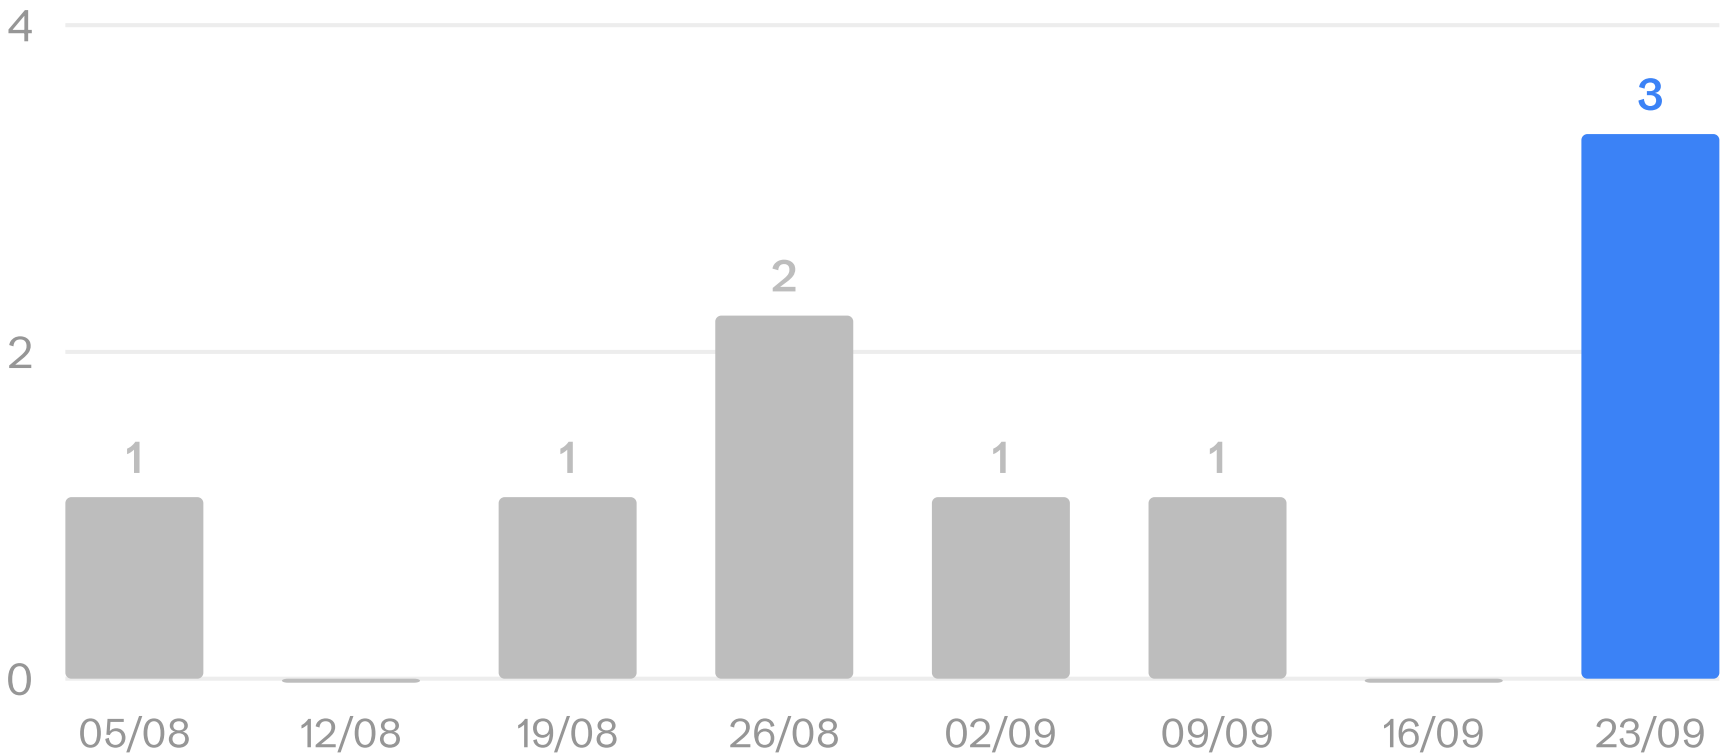


Funil de vendas é a frente que mais demora para concluir: mediana de 16 dias, contra 4 das outras.

COMO LER ESTE GRÁFICO

Cada linha é um grupo, e a caixa mostra onde cai a metade dos casos. O traço dentro da caixa é o valor típico (a mediana). A linha vai até o P90, abaixo do qual ficam 9 em cada 10 casos. Cada ponto além dela é um caso isolado. O número ao lado (n) diz quantos casos entraram na conta.

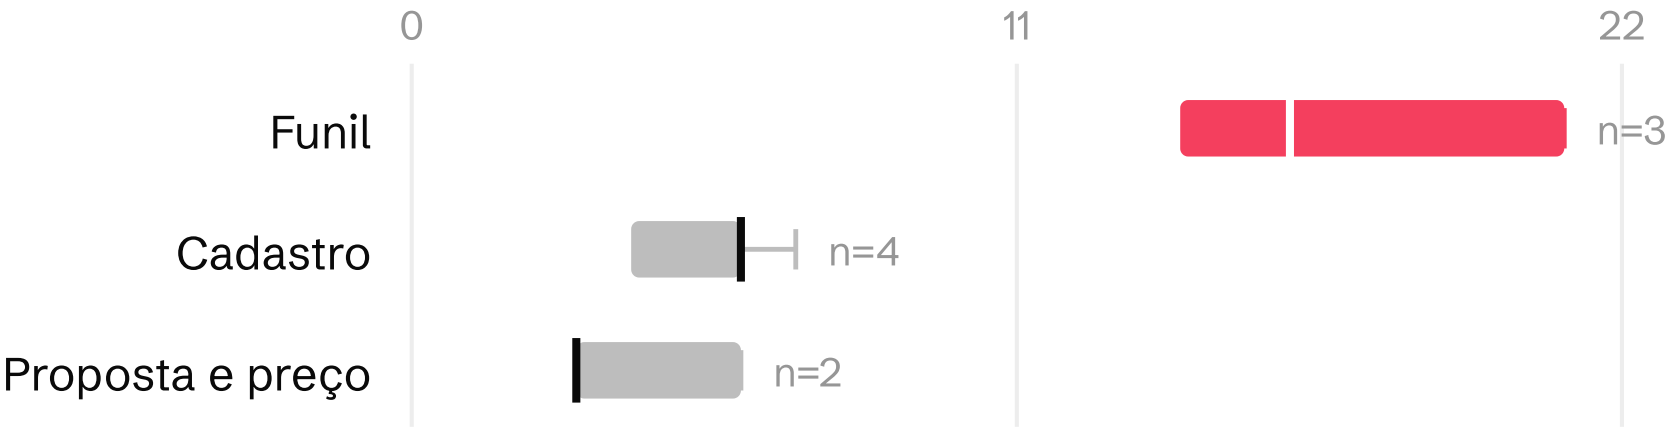


**14 das 22 atividades que
faltam ainda não começaram,
e 1 está bloqueada.**

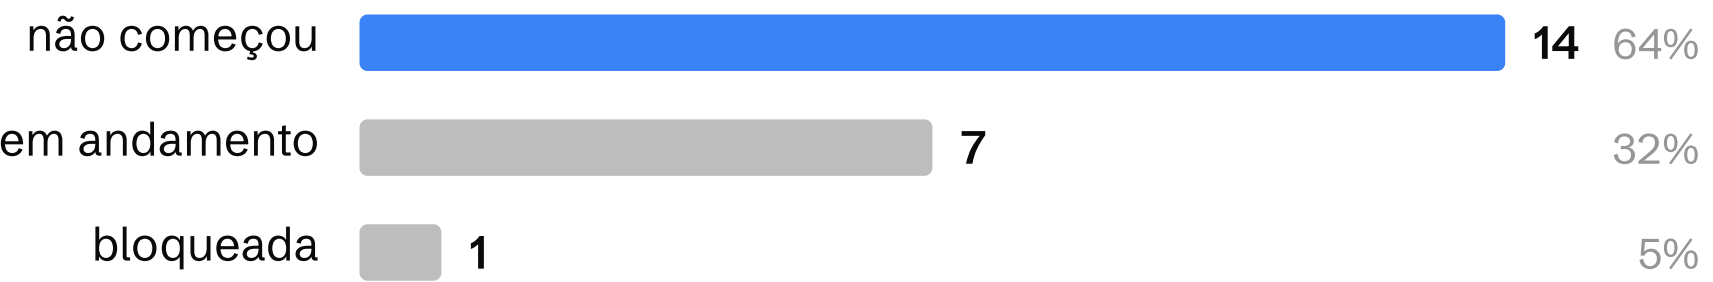


Integração com o ERP e Treinamento e virada dividem os atrasos: 4 cada, de 15 atrasadas.

CONTEXTO

Parte dos atrasos da integração vem do mesmo ponto: o acesso ao ERP chegou três semanas depois do previsto.

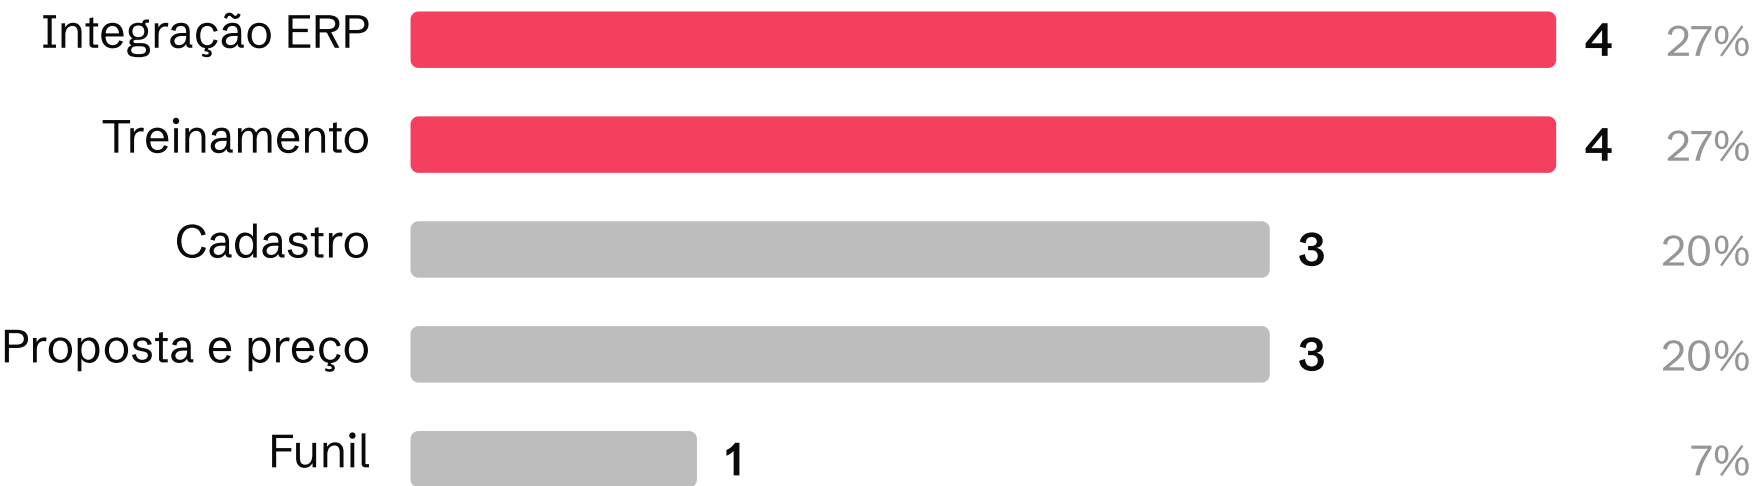


A atrasada típica passou 32 dias do prazo, e a pior, Pedidos do CRM para o ERP, está 53 dias atrasada.

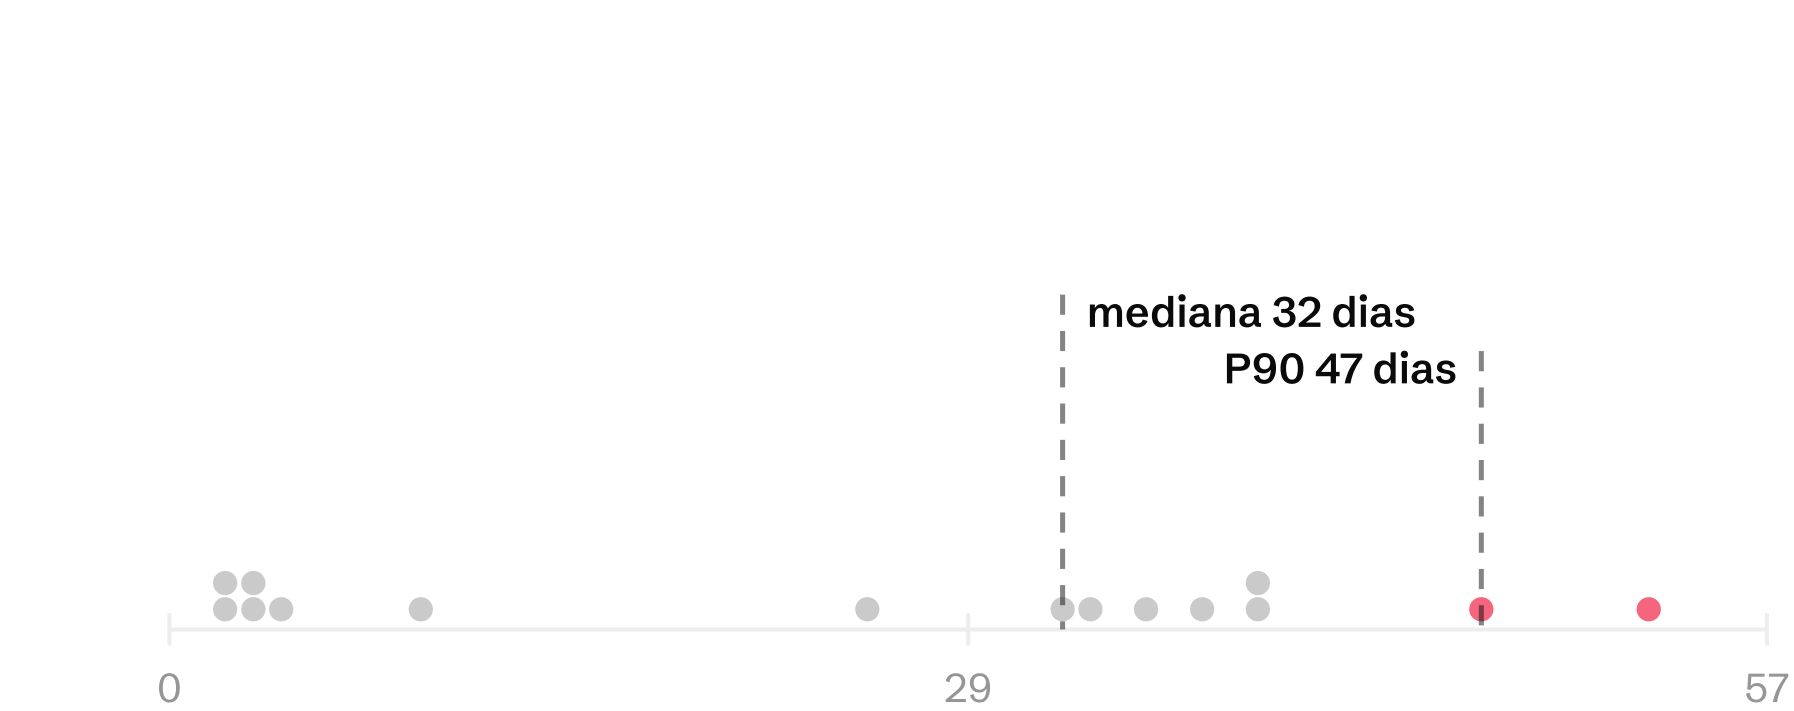


cada ponto é uma atividade atrasada, na posição dos dias de atraso em dias

Carla está com 7 das 22 atividades que faltam, e 3 estão sem responsável.

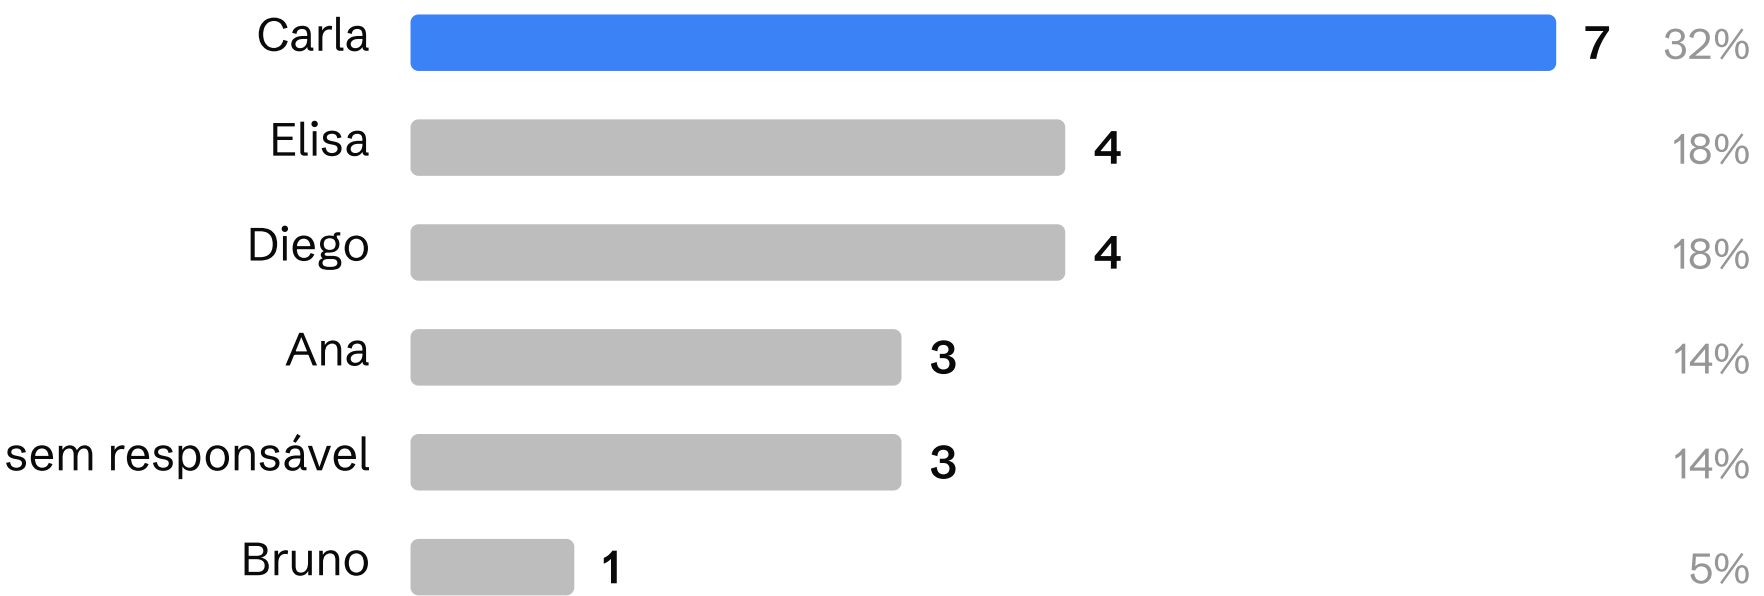


Integração com o ERP é a frente que vai exigir mais esforço: 43 dos 118 pontos em aberto.

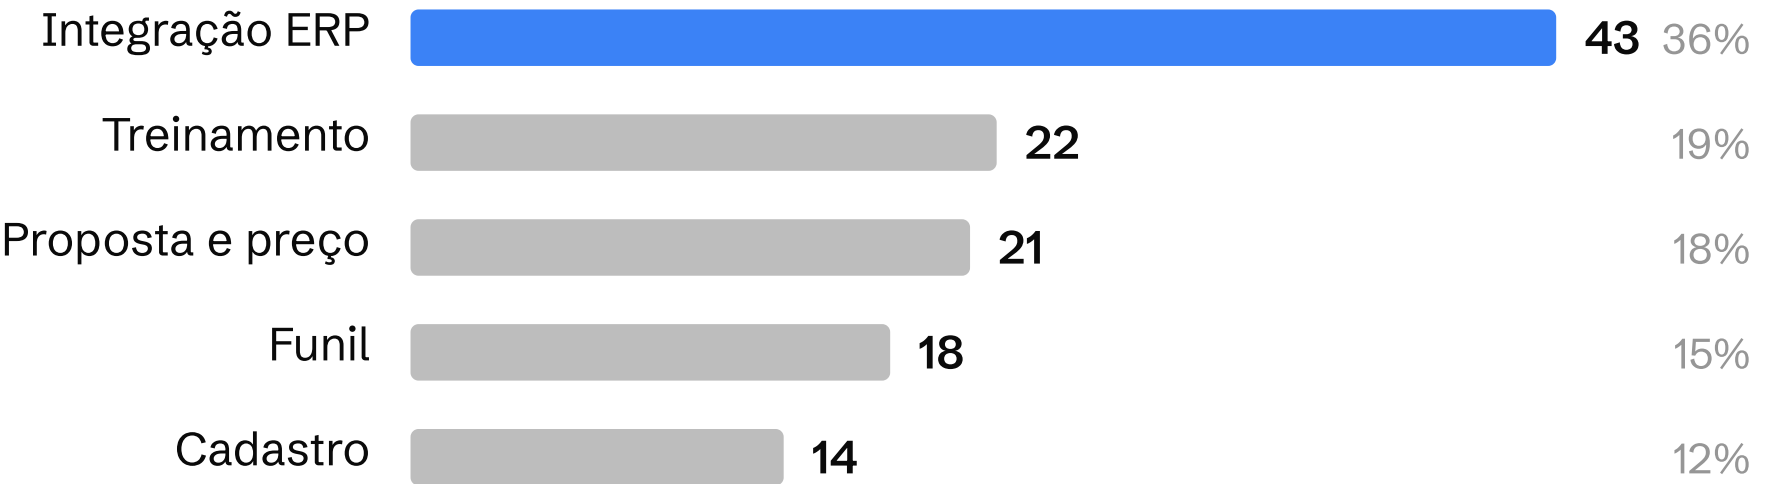

O acúmulo está em
Treinamento e virada, no que
ainda não começou: 5 das 22
atividades que faltam.

	não começou	em andamento	bloqueada
Cadastro	2	1	
Funil	3		
Integração ERP	2	4	
Proposta e preço	2	1	1
Treinamento	5	1	


Cadastro de clientes é a frente com atividades abertas há mais tempo: mediana de 62 dias.

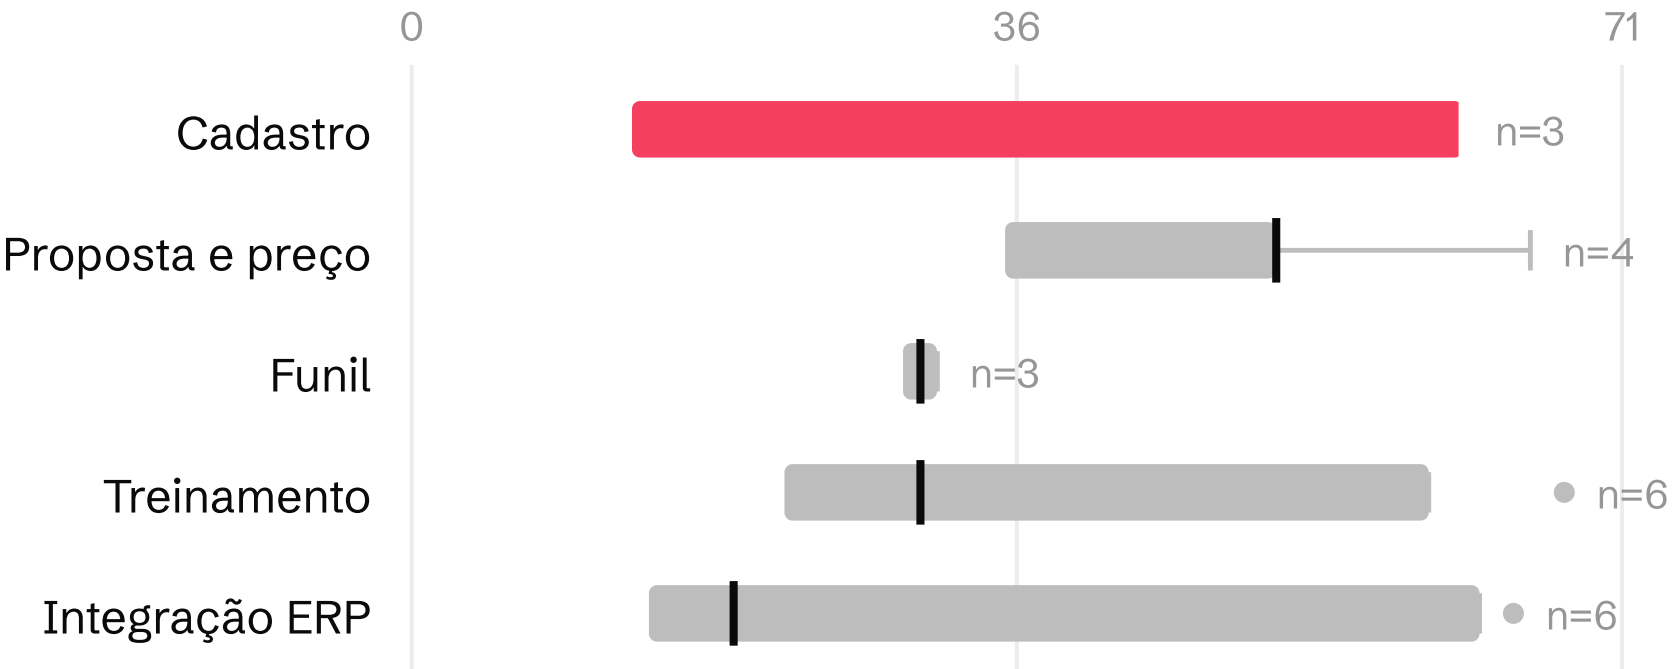

**Desenho da integração segura
4 outras atividades, e 6
atividades esperam alguma
outra terminar.**

CONTEXTO

O desenho da integração ficou para setembro porque a TI do cliente só liberou o acesso ao ERP em 02/09.

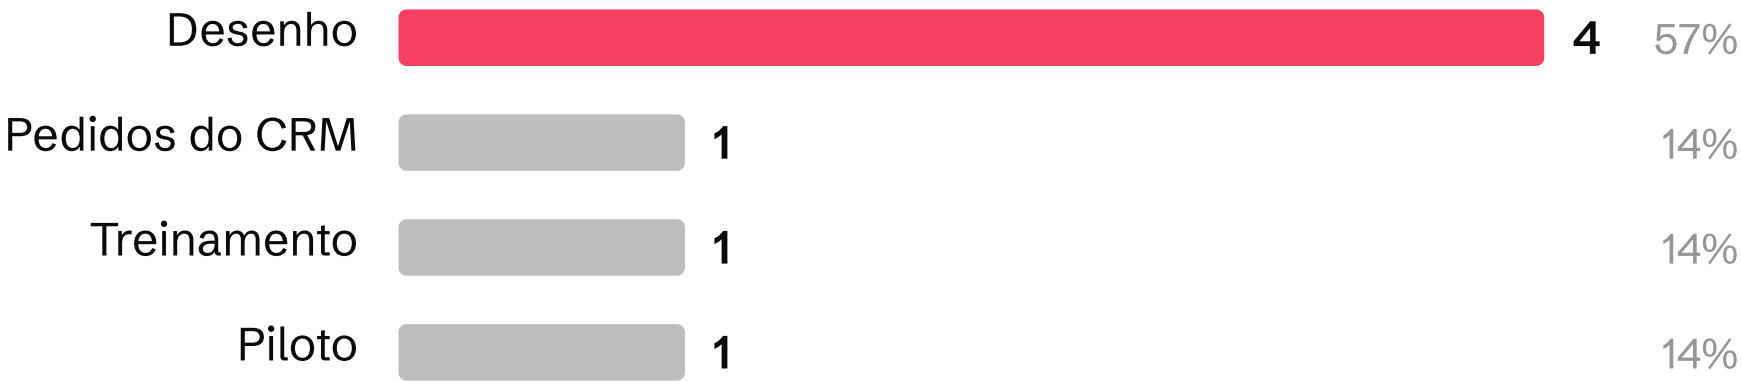


10 das 22 atividades em aberto são urgentes (P0 e P1).

CONTEXTO

P0 e P1 são as prioridades que o comitê do projeto marcou como urgentes.



Treinamento e virada deve vir primeiro: é a frente que entrega mais valor por unidade de esforço, com WSJF de 3,4 em 6 atividades.

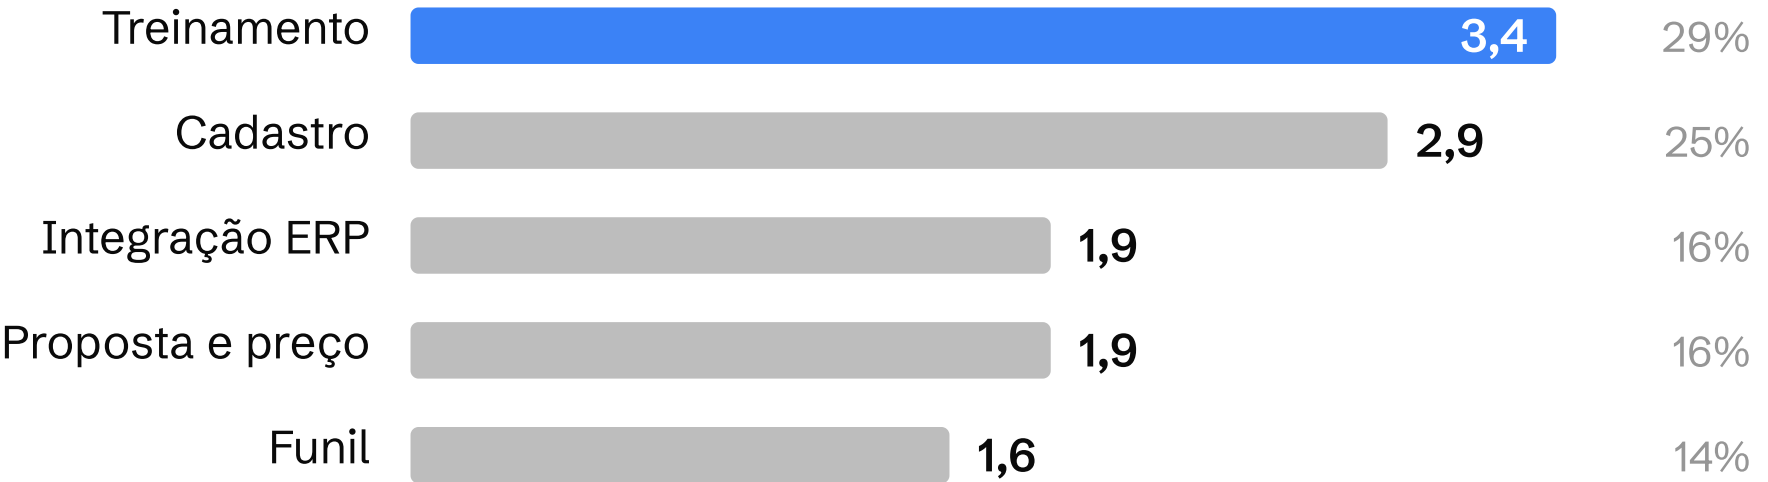


O QUE É WSJF

WSJF é o custo do atraso (valor para o negócio, urgência e redução de risco) dividido pelo esforço. Quanto maior, mais cedo a atividade deveria ser feita.


5 das 22 atividades pontuadas não podem esperar: muito valor e muita urgência.

COMO LER ESTE GRÁFICO


Cada ponto é um item, posto pelas duas notas escritas nos eixos. As linhas tracejadas são a mediana de cada eixo e dividem o gráfico em quatro quadrantes. O nome de cada quadrante diz o que fazer com os itens dele.

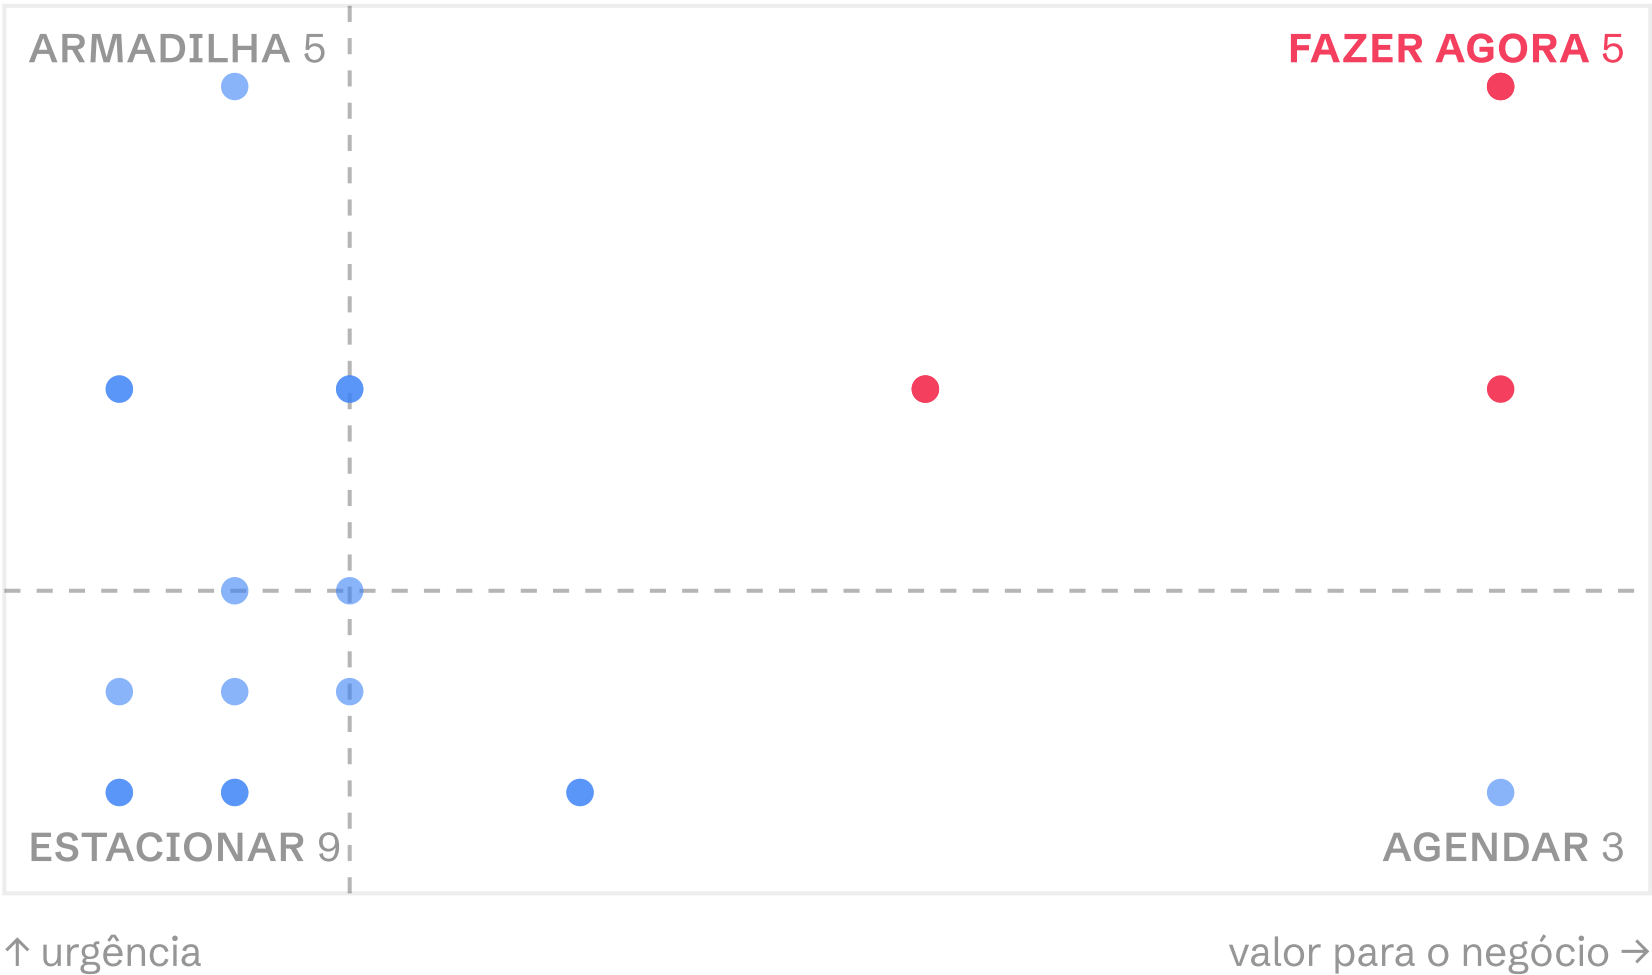

10 das 22 atividades pontuadas são ganho rápido: entregam valor sem custar caro.

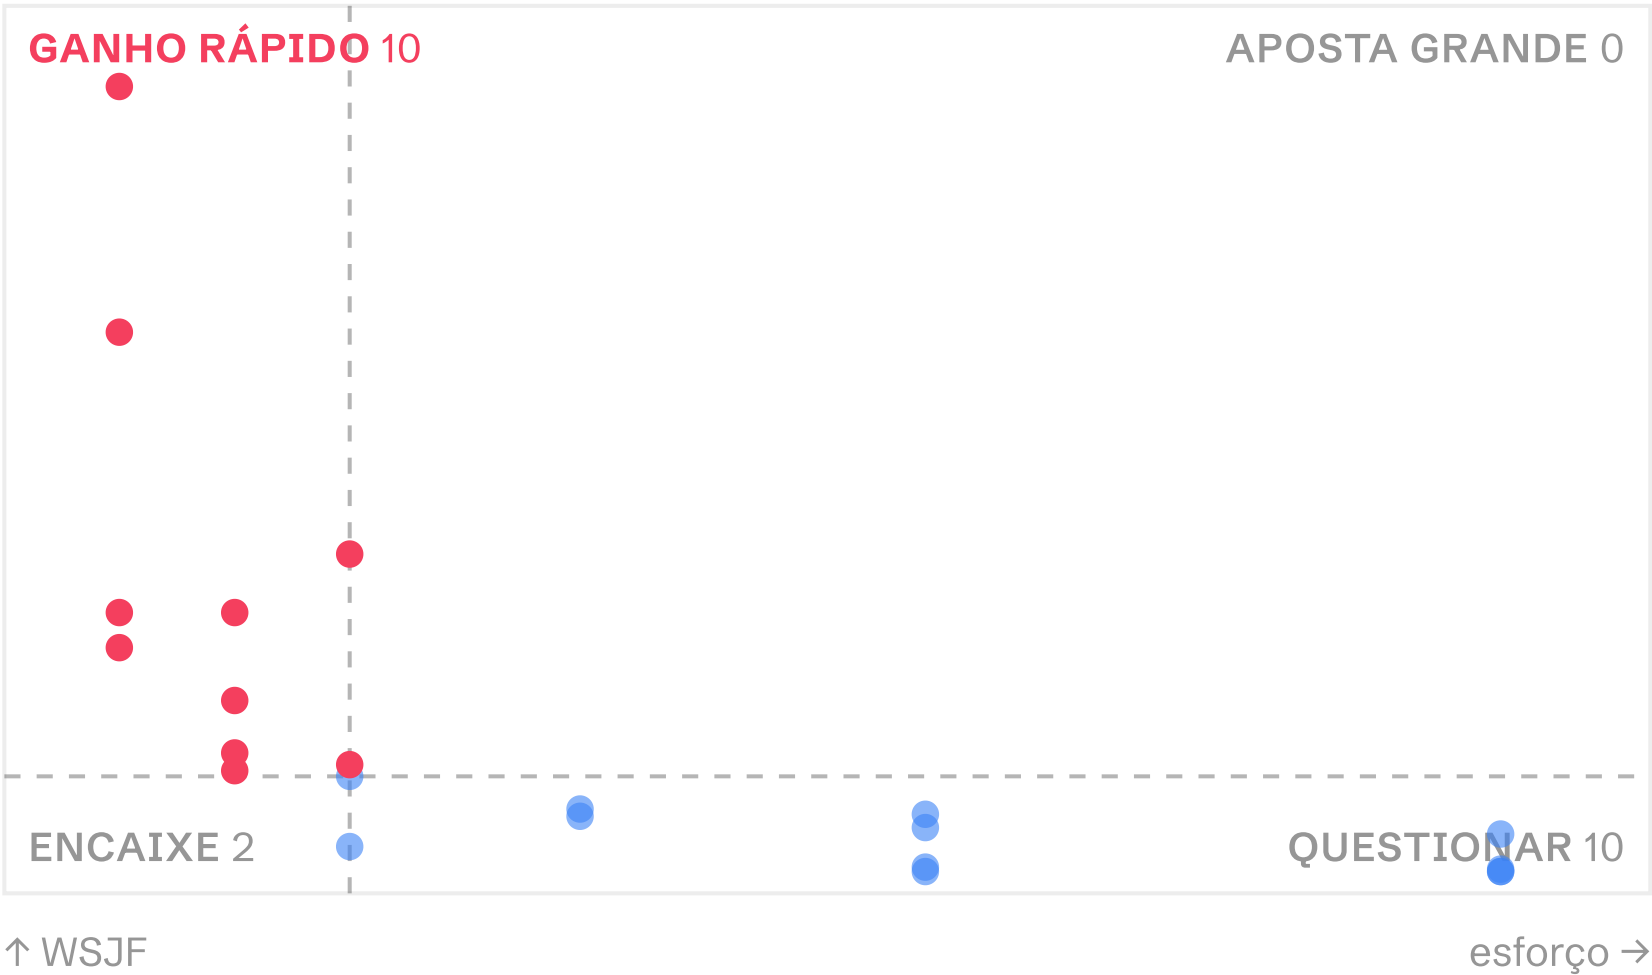

3 das 22 atividades pontuadas
são apostas estratégicas:
entregam valor e tiram risco
junto.

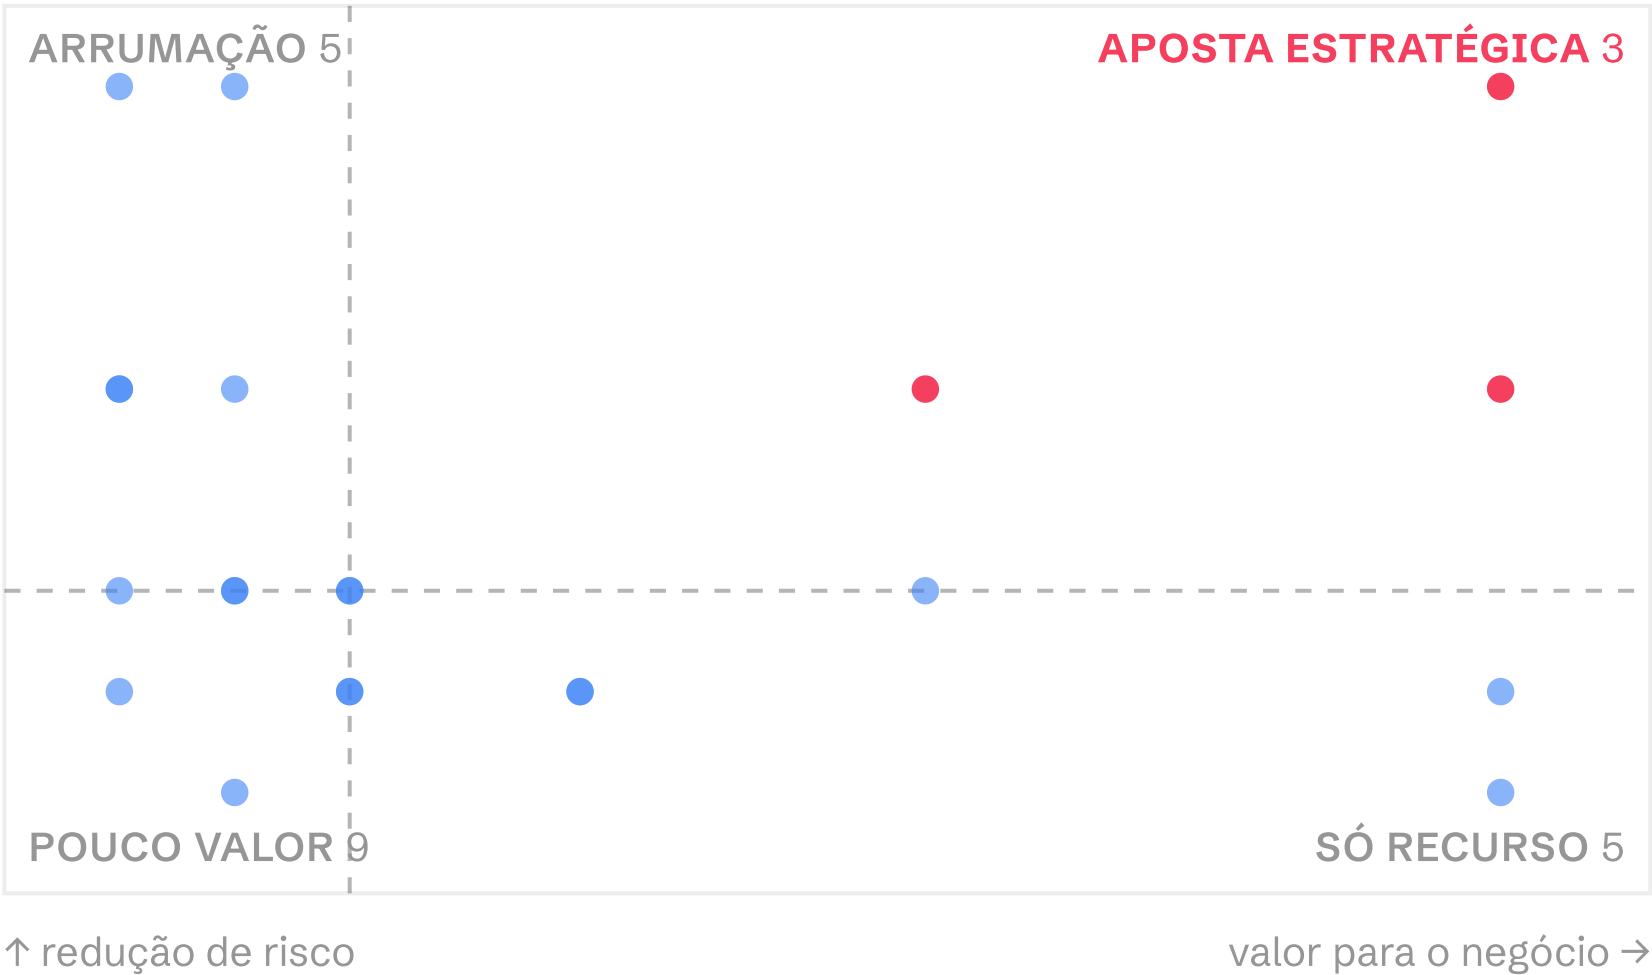

O que continua em aberto (1/3)

Na ordem em que o trabalho deveria ser atacado: WSJF primeiro, prioridade depois. Outras 10 atividades, com prazo mais distante, ficaram fora desta lista.

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO	WSJF
Campos obrigatórios por tipo P2 Cadastro de clientes	Ana	27/09/2026	atrasada 3 dias	23,0
Piloto com uma filial P3 Treinamento e viradaespera: Treinamento dos vendedores Só entra depois do treinamento, por decisão da diretoria.	sem responsável	21/09/2026	atrasada 9 dias	16,0
Desenho da integração P0 Integração com o ERP Tudo da integração começa por aqui.	Ana	28/08/2026	atrasada 33 dias	9,7
Modelo de proposta em PDF P2 Proposta e preço	Carla	28/09/2026	atrasada 2 dias	8,0

O que continua em aberto (2/3)

Na ordem em que o trabalho deveria ser atacado: WSJF primeiro, prioridade depois. Outras 10 atividades, com prazo mais distante, ficaram fora desta lista.

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO	WSJF
Cientes do ERP para o CRM P2Integração com o ERPespera: Desenho da integração Espera o desenho técnico, fechado com a TI do cliente.	sem responsável	28/09/2026	atrasada 2 dias	8,0
Acompanhamento pós-virada P2Treinamento e virada	Bruno	30/09/2026	não começou	7,0
Manual do vendedor P3Treinamento e virada	Diego	26/09/2026	atrasada 4 dias	5,5
Etapas do funil P0Funil de vendas	Carla	04/10/2026	não começou	4,0

O que continua em aberto (3/3)

Na ordem em que o trabalho deveria ser atacado: WSJF primeiro, prioridade depois. Outras 10 atividades, com prazo mais distante, ficaram fora desta lista.

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO	WSJF
Treinamento do backoffice P3 Treinamento e virada	Carla	14/08/2026	atrasada 47 dias	3,7
Treinamento dos vendedores P1 Treinamento e virada	Diego	05/09/2026	atrasada 25 dias	3,5
Desconto com aprovação P0 Proposta e preço Aguardando a diretoria definir as alçadas de desconto.	Diego	01/10/2026	bloqueada	3,3
Limpar a base de clientes P3 Cadastro de clientes	Elisa	26/08/2026	atrasada 35 dias	2,4

* CONFIDENCIAL · USO DO CLIENTE

Obrigado.

Cada gráfico deste relatório responde uma pergunta sobre o andamento do trabalho.
